

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	9,0°C	0,0 mm/h	5,3 m/s	282°	54%
12:00	 Déšť	10,1°C	0,1 mm/h	4,6 m/s	254°	51%
18:00	 Déšť	11,6°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	245°	42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Juínek							
Julínek Daniel MI	Podlahy PVC	3	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	2	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
REMIKSTAV							
Bryndač Petr	SDK	2	8				
Stošek							
Stošek Luboš	Malby A Nátěry	2	8				
TOROstavby							
Buroň Jaroslav	SDK	5	8				
VAMAR							
Čech Jiří	Jádr.vrtání	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB 1.PP - 3.NP
- kompletace koncových prvků na 1.NP a 3.NP - elektro SIL a hl.rozvaděč
- 1.NP - 4.-tá etapy EPS a SLB
- 2.NP opravy štukových omítek, zednické opravy kolem prostupů v příčkách
- průběžné úklidy stavby
- mtž SDK podhledů 2.NP včetně límců, sádrování a broušení
- keramické obklady 2.NP - spárování
- malby
- pokládka PVC podlah včetně antistatického PVC
- mtž ramp v místnostech 2.NP a jejich kompletace
- mtž SDK PO příčky 2.NP
- návozy materiálů
- mtž radiátorů a ZP ZTI
- jádrové vrtání díry pr.250mm ve strojovně 3.NP pro novou pozici ventilátoru - VCP


IMG_0268.jpg



IMG_0269.jpg



IMG_0271.jpg

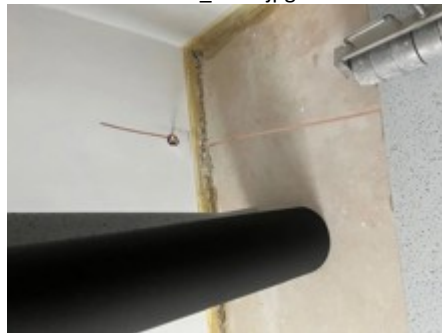

57a5fe9a-2985-455a...d6a71.jpg



Podpisy:
