

Protokol tlakové zkoušky

SWIETELSKY stavební s.r.o.

FN OLOMOUC - PARKOVIŠTĚ POD DĚTSKOU KLINIKOU


Obsah:

ŠD1 - ŠD2	
Test č. 1: 13.06.2019 - 11:38:25 - Obstal ve zkoušce	2
ŠD2 - ŠD3	
Test č. 2: 13.06.2019 - 11:43:42 - Obstal ve zkoušce	3
ORL - ŠD5	
Test č. 3: 13.06.2019 - 11:49:10 - Obstal ve zkoušce	4
ŠD5 - ŠD6	
Test č. 4: 13.06.2019 - 11:54:12 - Obstal ve zkoušce	5
ŠD6 - ŠD7	
Test č. 5: 13.06.2019 - 12:00:01 - Obstal ve zkoušce	6

Název úseku: **ŠD1 - ŠD2**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠD1**
 K šachtě: **ŠD2**
 Stanoviště: **IO 03**
 Město: **Olomouc**
 Ulice: **I.P. Pavlova 6**

Zkoušející: **Bronislav Pospíšil**Výstroj: **TestBoy**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LD**Senzor: **091109**Zkouška senzoru: **06.7.2018**

Graf - průběh testu

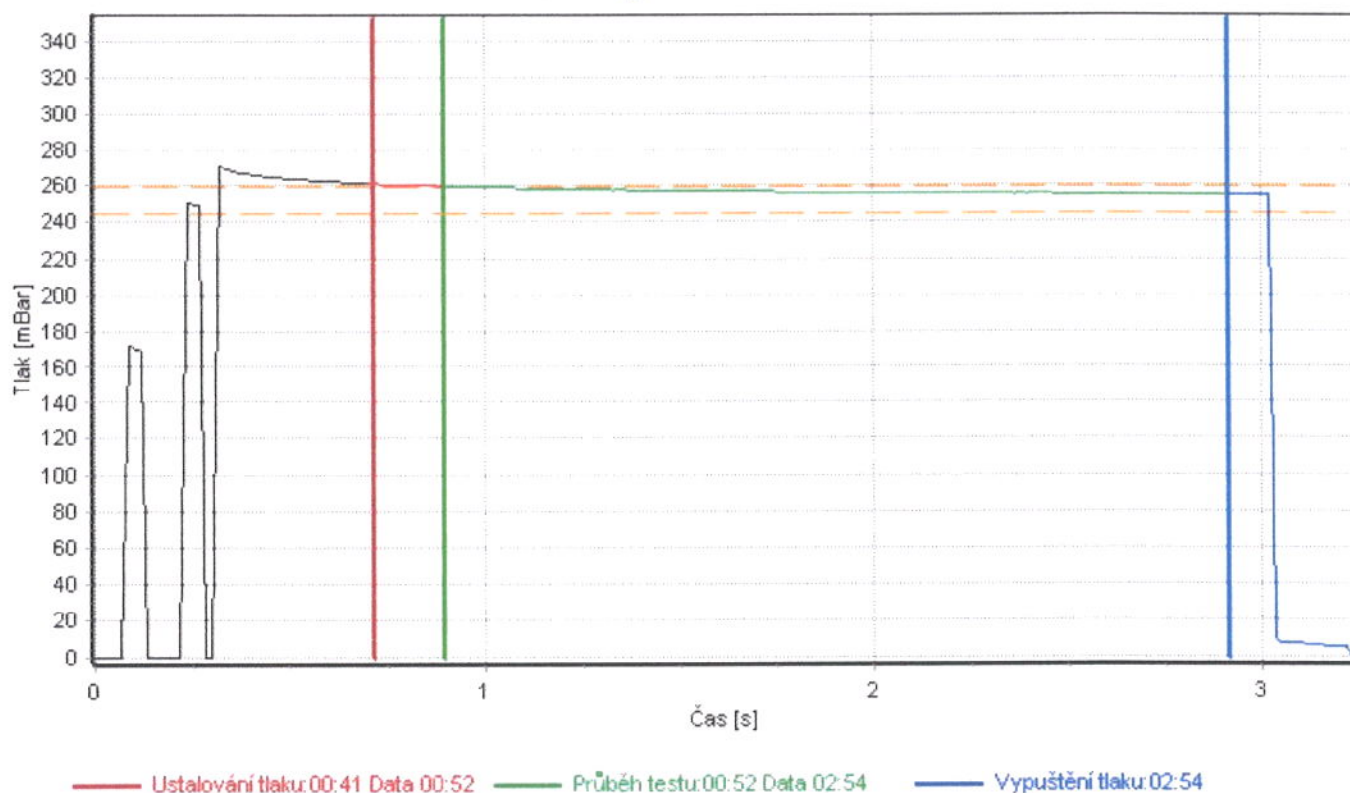

Plán:

Test č.: **1**Materiál: **PVC-U**Požadovaný minimální přetlak: **200 mBar**

Vnitřní ochrana:

Počáteční přetlak: **259,68 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Připustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **5,04 mBar**Délka zkušební trati: **5,74 m**Doba ustálení: **0:12 min**Zkouška byla provedena **13.6.2019 ve 8:12:13 hodin.**Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**Skutečná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**


Zákazník:

Swietelsky s.r.o.

Název úseku: **ŠD2 - ŠD3**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠD2**
 K šachtě: **ŠD3**
 Stanoviště: **IO 03**
 Město: **Olomouc**
 Ulice: **I.P. Pavlova 6**

Zkoušející: **Bronislav Pospíšil**Výstroj: **TestBoy**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LD**Senzor: **091109**Zkouška senzoru: **06.7.2018**

Graf - průběh testu

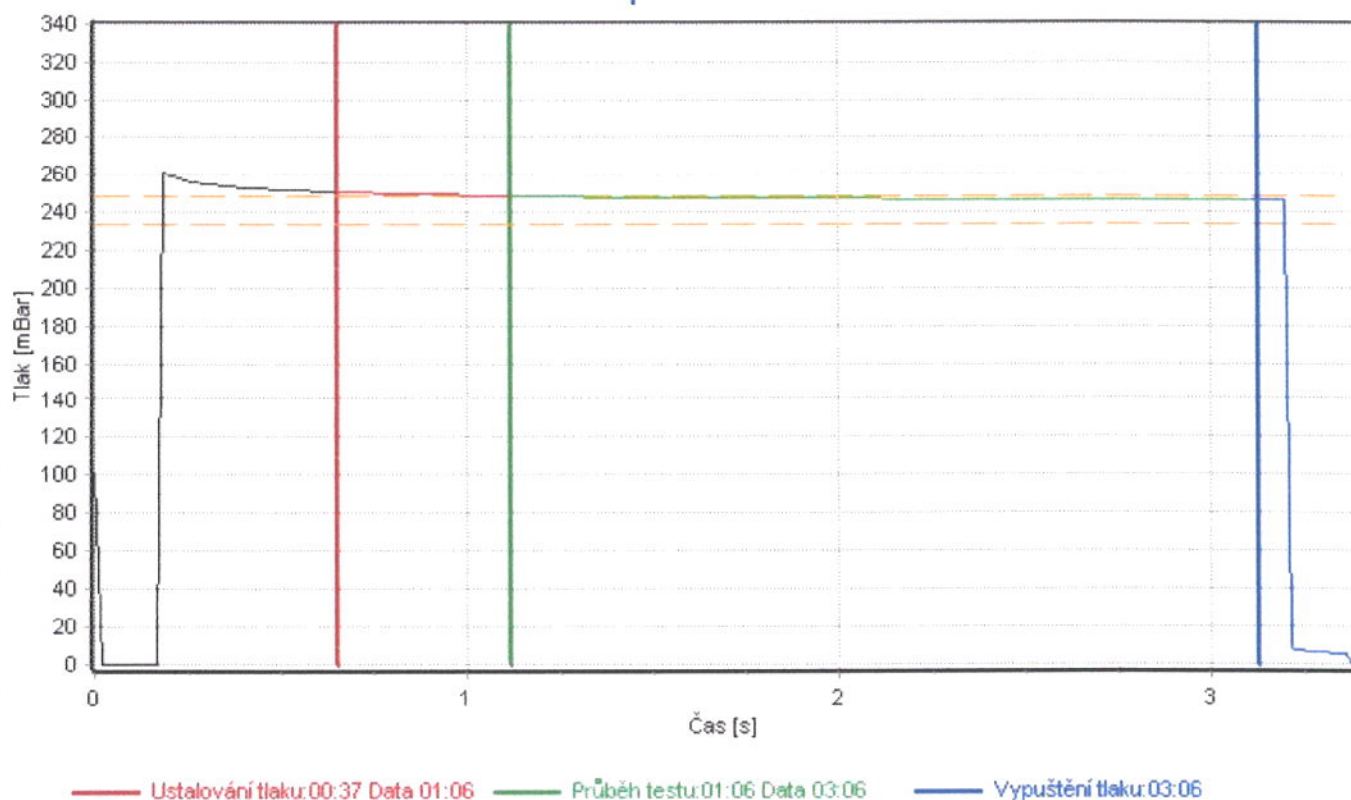

Plán:

Test č.: **2**Materiál: **PVC-U**Požadovaný minimální přetlak: **200 mBar**

Vnitřní ochrana:

Počáteční přetlak: **248,72 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Připustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **2,4 mBar**Délka zkušební trati: **2 m**Doba ustálení: **0:29 min**Zkouška byla provedena **13.6.2019 ve 8:46:21 hodin.**Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**Skutečná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**


Zákazník:

Swietelsky s.r.o.

Název úseku: **ORL - ŠD5**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ORL**
 K šachtě: **ŠD5**
 Stanoviště: **IO 03**
 Město: **Olomouc**
 Ulice: **I.P. Pavlova 6**

Zkoušející: **Bronislav Pospíšil**Výstroj: **TestBoy**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LD**Senzor: **091109**Zkouška senzoru: **06.7.2018**

Graf - průběh testu

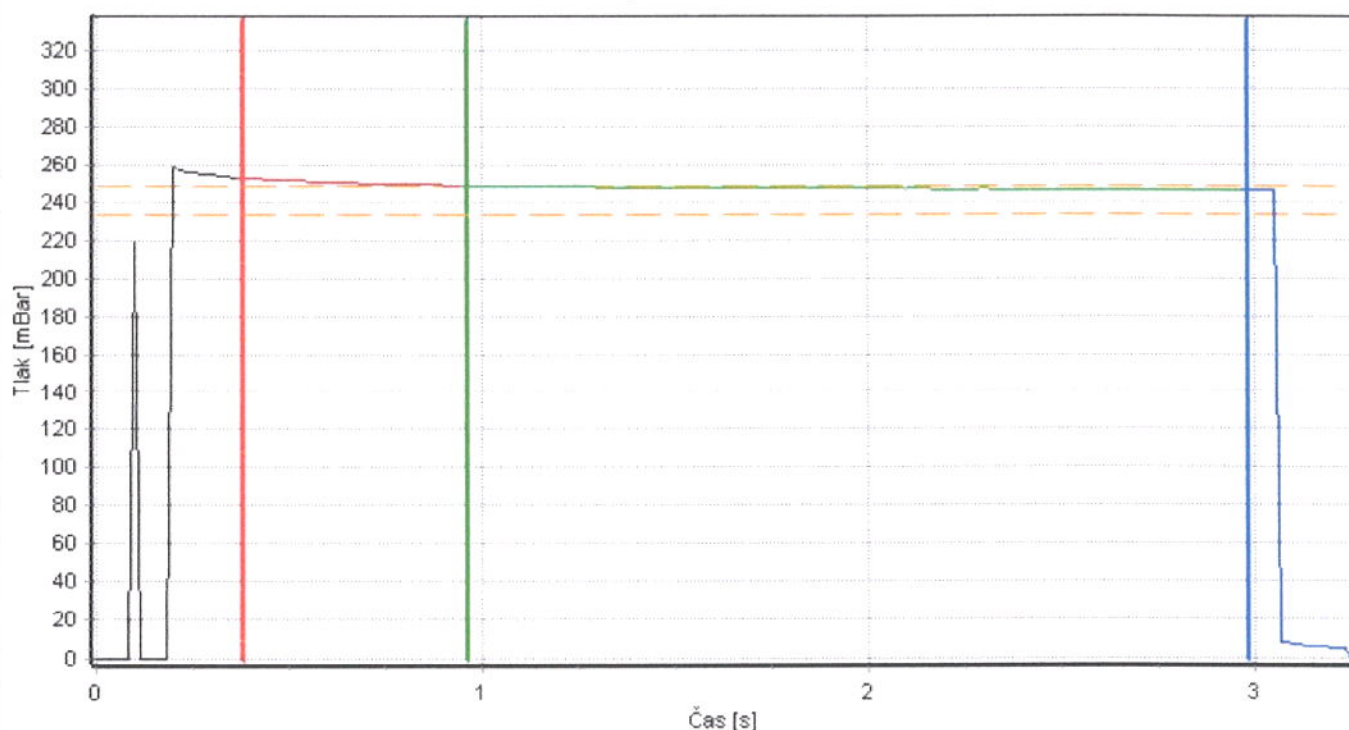

Plán:

Test č.:

3

Materiál: **PVC-U**Požadovaný minimální přetlak: **200 mBar**

Vnitřní ochrana:

Počáteční přetlak: **249,09 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Připustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **2,57 mBar**Délka zkušební trati: **2,03 m**Doba ustálení: **0:36 min**Zkouška byla provedena **13.6.2019 ve 9:18:34 hodin.**Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**Skutečná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**


Zákazník:

Swietelsky s.r.o.

Název úseku: **ŠD5 - ŠD6**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠD5**
 K šachtě: **ŠD6**
 Stanoviště: **IO 03**
 Město: **Olomouc**
 Ulice: **I.P. Pavlova 6**

Zkoušející: **Bronislav Pospíšil**Výstroj: **TestBoy**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LD**Senzor: **091109**Zkouška senzoru: **06.7.2018**

Graf - průběh testu

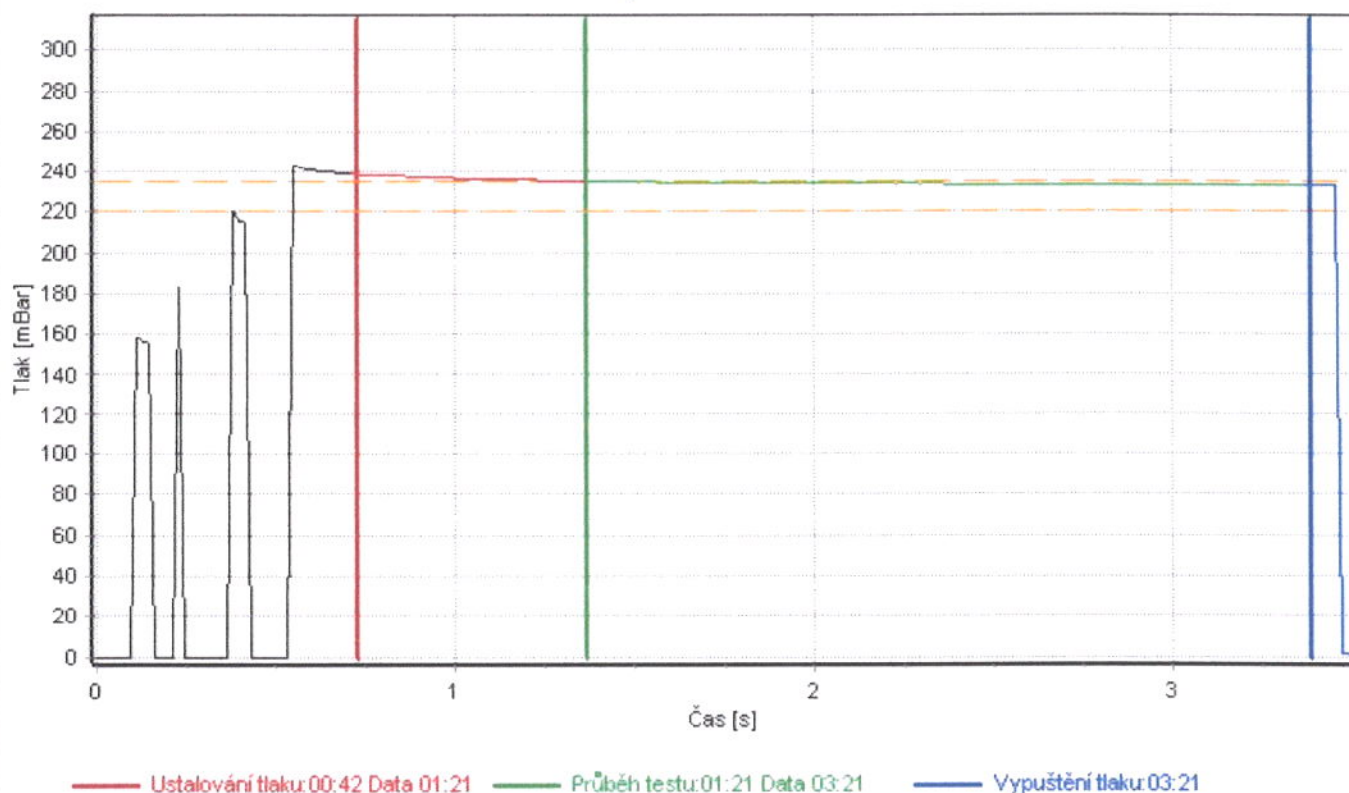

Plán:

Test č.: **4**Materiál: **PVC-U**Požadovaný minimální přetlak: **200 mBar**

Vnitřní ochrana:

Počáteční přetlak: **235,24 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Připustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **2,01 mBar**Délka zkušební trati: **31,14 m**Doba ustálení: **0:39 min**Zkouška byla provedena **13.6.2019 ve 9:48:11 hodin.**Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**Skutečná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**


Zákazník:

Swietelsky s.r.o.

Název úseku: **ŠD6 - ŠD7**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠD6**
 K šachtě: **ŠD7**
 Stanoviště: **IO 03**
 Město: **Olomouc**
 Ulice: **I.P. Pavlova 6**

Zkoušející: **Bronislav Pospíšil**Výstroj: **TestBoy**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LD**Senzor: **091109**Zkouška senzoru: **06.7.2018**

Graf - průběh testu

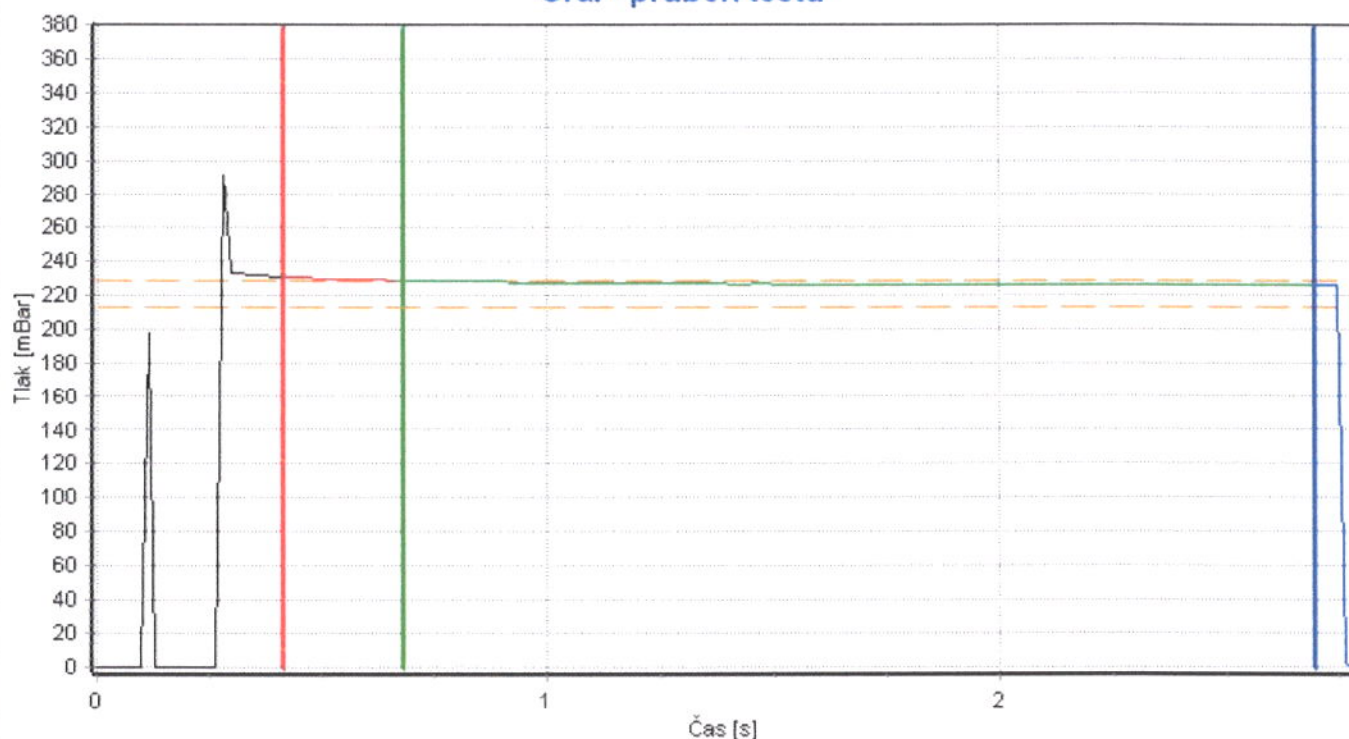

— Ustabilování tlaku:00:24 Data 00:39 — Průběh testu:00:39 Data 02:40 — Vypuštění tlaku:02:40

Plán:

Test č.:

5Materiál: **PVC-U**Požadovaný minimální přetlak: **200 mBar**

Vnitřní ochrana:

Počáteční přetlak: **228,8 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Připustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **2,77 mBar**Délka zkušební trati: **27 m**Doba ustálení: **0:17 min**Zkouška byla provedena **13.6.2019 ve 10:30:41 hodin.**Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**Skutečná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Swietelsky s.r.o.

Souhrn

Testované úseky celkem: **5** o celkové délce: **67,91 m**.

Otestováno **5** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **67,91 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Pro:

Swietelsky s.r.o.

Vypracoval:

SEZAKO Prostějov s.r.o., 79601 Prostějov, J.B. Pecky 4342/14, Tel.: 582 336 366

Dodavatel:

Zákazník:

**SEZAKO**® Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14
796 01 PROSTĚJOV
TEL.: 582 336 366
tlakové zkoušky
