



STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	6,5°C	0,0 mm/h	7,8 m/s	255°	65%
12:00	Polojasno	7,7°C	0,0 mm/h	6,3 m/s	274°	54%
18:00	Polojasno	6,5°C	0,0 mm/h	5,7 m/s	257°	58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Elektro montáže Huřín							
Cagaš Marek	Elektro SLB	1	8	Nožka Petr	Elektro SIL	1	8
Machač Lukáš	Elektro SIL	1	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Husak Andrej	Bourací a zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8				
KOBREXY							
Hrabica Robin	Lité Podlahy	1	8	Pavelka Marian	Lité Podlahy	1	8
Kresta Tomáš	Lité Podlahy	1	8	Šmík Adam	Lité Podlahy	1	8
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8	Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8
PROFITUBE							
Chrobok René	Potrubní Pošta	1	8	Vlček David	Potrubní Pošta	1	8
Toufar Tíbor	Potrubní Pošta	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- dočištění stropů pro skladby podlah
- přesuny a odvozy sutě
- sondy pro budoucí překlady na dveřmi 2.NP
- vyzdívky a dozdvíky 2.NP
- realizace EPS v 1.PP
- zahájení pokládky skladeb podlah na 2.NP
- úklid schodiště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Záhradník Miroslav (Administrátor)	NÁZEV DODAVATELE	OSBAU s.r.o.
-------	------------------------------------	------------------	--------------

Dnešního dne zhotovitel zjistil, že šachta, kde je stoupačka poštovního potrubí :

- šachta je ukončena stropní deskou, která leží na stropě nad 1.NP. Tzn., že stropní deska šachty je součástí stávající skladby podlah
- šachta vede do 1.PP jako "komín", bez jiných podlažních konstrukcí a je ukončena pouze rastrových podhledem
- stropní deska šachty byla částečně poškozená při bourání podlah


Zhotovitel obratem informoval TDS a AD, kteří přizvali na pátek 26.1. statika DPS.

PŘÍLOHY

IMG_9596.jpg



IMG_9597.jpg

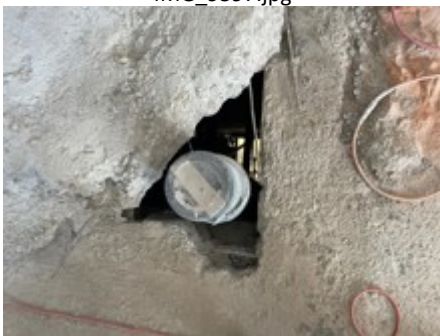

IMG_9600.jpg



IMG_9601.jpg



IMG_9602.jpg



Podpisy:
