



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA

ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

Objekt (název a druh)	: Fakultní nemocnice Olomouc p.o –Dětská klinika objekt Q2
Obec, město	: Olomouc
Ulice	: I. P. Pavlova 186/6
Investor (organizace)	: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6 Olomouc 779 00, IČO: 000 988 92

ZPRÁVA

č.1K 31.8. /2021 Dodatek č. 2

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – těsnící systémy protipožárních ucpávek HILTI, DUNAMENTI**

Na základě § 7 odstavce 8 Vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dle ověřených katalogových listů.

Montáž systému HILTI, DUNAMENTI	17.8.2021
Kontrola provozuschopnosti systémů HILTI, DUNAMENTI	17.8.2021
Uvedení systémů HILTI, DUNAMENTI do provozu	17.8.2021
Následná kontrola provozuschopnosti (revize)	17.8.2022

Montáž, kontrolu a uvedení systémů do provozu provedl Milan Divácký

Ve Slavkově u Brna dne: 17.8.2021

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
e-mail : chladek@pozarniservis.cz
www.pozarniservis.cz

IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

**Soupis protipožární zajištěných prostupů technických instalací požární dělicími konstrukcemi
systémovými produkty HILTI, DUNAMIENTI**

STAVBA: FN Olomouc, ESOX

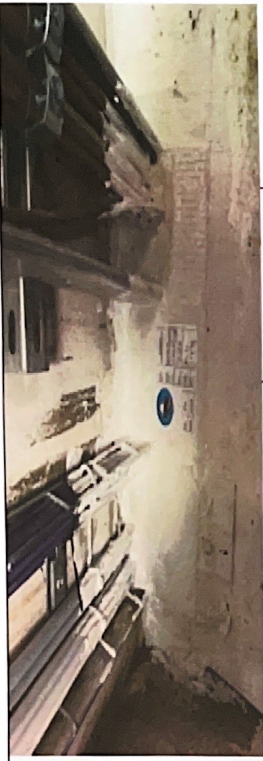
Prostup číslo	Umístění	počet	Typ konstrukce	Typ požární dělicí konstrukce	Použitý materiál	Požární odolnost inspasy	Datum uvedení do provozu
71	2NP, šachta - recepcce	2	svazek elektrických kabelů Ø 40	beton	CP670	EI60	5.8.
72	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 30	beton	CP670	EI60	5.8.
73	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	CP670	EI60	5.8.
74	2NP, šachta - recepcce	1	zacelení otvoru 300 x 150	beton	CP670	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 60	beton	CP670	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 30	beton	CP670	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	CP670	EI60	5.8.
75	2NP, šachta - recepcce	1	zacelení otvoru 1000 x 200	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 30	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 70	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	trubní ucpávka kov 150 x 150	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
76	2NP, šachta - recepcce	1	zacelení otvoru 400 x 200	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		4	elektrický kabel Ø 40	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	zacelení otvoru 400 x 200	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
77	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 40	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	zacelení otvoru 400 x 200	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 60	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
78	2NP, šachta - recepcce	1	trubní ucpávka kov Ø 50	zedeť	CP670	EI30	5.8.
		1	trubní ucpávka kov Ø 50	zedeť	CP670	EI30	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 40	zedeť	CP670	EI30	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 40	zedeť	CP670	EI30	5.8.
79A	8NP, strojovna	1	vzduchotechnika Ø 300	zedeť	CP670	EI30	5.8.
		1	vzduchotechnika Ø 300	zedeť	CP670	EI30	5.8.
		1	vzduchotechnika Ø 300	zedeť	CP670	EI30	5.8.
		1	vzduchotechnika Ø 300	zedeť	CP670	EI30	5.8.
80A	8NP, strojovna	2	svazek elektrických kabelů Ø 20	zedeť	CP611A	EI30	5.8.
		2	svazek elektrických kabelů Ø 20	zedeť	CP611A	EI30	5.8.
		1	trubní ucpávka plast Ø 40	zedeť	CP611A	EI30	10.8.
		1	trubní ucpávka plast Ø 40	zedeť	CP611A	EI30	10.8.
83B	8NP, strojovna	1	zacelení otvoru 1700 x 700	strop	polylack K + F	EI30	10.8.
		2	vzduchotechnika 450 x 450	strop	polylack K + F	EI30	10.8.
		1	zacelení otvoru 1700 x 700	strop	polylack K + F	EI30	10.8.
		2	vzduchotechnika 450 x 450	strop	polylack K + F	EI30	10.8.

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi systémovými produkty HILTI

STAVBA: FN Olomouc, ESOX

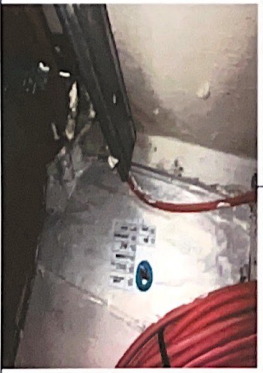
Prostup číslo:	Umístění	počet	Typ konstrukce	Typ požárně dělicí konstrukce	Použitý materiál	Požární odolnost nepřávký	Datum uvedení do provozu	FOTO
71	2NP, šachta - recepcce	2	svazek elektrických kabelů Ø 40	beton	CP670	EI60	5.8.	
72	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 30	beton	CP670	EI60	5.8.	
73	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	CP670	EI60	5.8.	



	74	2NP, šachta - recepcce					
	1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	CP670	EI60	5.8.	
	1	svazek elektrických kabelů Ø 30	beton	CP670	EI60	5.8.	
	1	svazek elektrických kabelů Ø 60	beton	CP670	EI60	5.8.	
	1	zacementí otvoru 300 x 150	beton	CP670	EI60	5.8.	

75	2NP, šachta - recepcce	1	trubní ucpávka kov 150 x 150	beton	polyack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 70	beton	polyack K + F	EI60	5.8.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 30	beton	polyack K + F	EI60	5.8.
		1	zacement otvoru 1000 x 200	beton	polyack K + F	EI60	5.8.

77	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 40	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	zacementí otvoru 400 x 200	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
76	2NP, šachta - recepcce	1	svazek elektrických kabelů Ø 50	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		4	elektrický kabel Ø 40	beton	polylack K + F	EI60	5.8.
		1	zacementí otvoru 400 x 200	beton	polylack K + F	EI60	5.8.



80A	8NP, strojovna	1	svazek elektrických kabelů Ø 40	zcd	CP670	EI60	5.8.	
79B	8NP, strojovna	1	trubní ucpávka kov Ø 50	zcd	CP670	EI60	5.8.	
79A	8NP, strojovna	1	trubní ucpávka kov Ø 50	zcd	CP670	EI60	5.8.	
78	2NP, šachta - recepce	1	svazek elektrických kabelů Ø 60	beton	polyack K + F	EI60	5.8.	
		1	zacementí otvoru 400 x 200	beton	polyack K + F	EI60	5.8.	

80B	8NP, strojovna	1	svazek elektrických kabelů Ø 40	zed'	CP670	EI60	5.8.	
81A	8NP, strojovna	1	vzduchotechnika Ø 300	zed'	CP670	EI60	5.8.	
81B	8NP, strojovna	1	vzduchotechnika Ø 300	zed'	CP670	EI60	5.8.	
82A	8NP, strojovna	2	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP611A	EI60	5.8.	
82B	8NP, strojovna	2	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP611A	EI60	5.8.	

84	7NP, chodba	2	vzduchotechnika 450 x 450	strop	polylack K + F	EI30	10.8.
		1	zacement otvoru 1700 x 700	strop	polylack K + F	EI30	10.8.
83B	8NP, strojovna	1	trubni ucpávka plast Ø 40	zeď	CP611A	EI30	10.8.
83A	8NP, strojovna	1	trubni ucpávka plast Ø 40	zeď	CP611A	EI30	10.8.



Závěr

Z provedení montáže požární bezpečnostního zařízení (PBZ)
těsnících systémů protipožárních ucpávek HILTI, DUNAMENTI
v objektu

Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2

JE PROVOZUSCHOPNÉ

(a odpovídá ve smyslu ust. § 7 odst. 8 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Kontrolované zařízení je funkční a provozuschopné

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností
požárně dělicích konstrukcí

- HILTI protipožární tmel CP 670, CP 611 A,
- DUNAMENTI protipožární tmel Polylack K/F

Kontrolu dodržování technologických postupů prováděl Milan Diváček, osoba
oprávněná k montáži, instruktaži pracovníků a kontrole dodržování
technologických postupů protipožárního systému HILTI, DUNAMENTI.

Kontrolu provozuschopnosti provedl Milan Diváček

Následná kontrola – revize, dle cyklických kontrol požární ochrany pro daný objekt,
nejedle do jednoho roku tj. **17.8.2022**

Datum: 17.8.2020
Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98 2003
Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

- a) **provizovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6, 779 00 Olomouc
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2

- c) **umístění:** viz bod b); soupis protipožárně zajištěných prostorů technických instalací požárně
délčím konstrukcemi, celkem **14 prostorů**
druh PBZ: těsnící systémy protipožárních ucpávek
výrobce: HIL-TL, DUNAMENTI
typové označení:

- HL-TL protipožární tmel CP 670, CP 611A,
- DUNAMENTI protipožární tmel Polyack K/F

- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ	je	ne	provozuschopné
-----	----	----	----------------

- e) **datum provedení kontroly:** 17.8.2021
datum příští kontroly: do 17.8.2022

- f) **potvrzení dodavatele (provádějího)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše
uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy,
normativními požadavky, provozní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a
schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 17.8.2021
Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Kazímko a podpis
