

DARY: 9001

Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

INVESTICE
FRM 2021
POL. č. 1.2.74

OI

obd.

11/2021

Evidenční číslo dokladu

FP-2021-24-000086

výše závazku, nároku

135 100,00

Firma - věřitel, dlužník Veolia Energie ČR, a.s.

Předmět Smlouva o dílo - REKONSTRUKCE A RESTAUROVÁNÍ

ZÁVAZEK**Finanční zdroje krytí závazku:**

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
Individuální příslib ve výši:	PŘÍKAZCE OPERACE Ing. Čeněk Merta, MBA X Obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc	HLAVNÍ ÚČETNÍ Odbor ekonomických činností finanční referent - rozpočtář Fakultní nemocnice Olomouc 22-12-2021
Termín plnění závazku:	9-12-2021	9-12-2021
Limitovaný příslib na období:	Ing. František Václavík vedoucí útvaru hospodářské správy hlavní účetní Fakultní nemocnice Olomouc	Ing. František Václavík 64828
Výše limitu:		
Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
146	042	70	000			9999	321	50	000				135 100,00
246	042	70	000			9999	321	50	000				26 668,74
208	321	50	000				343	36	000				28 371,00
													1 702,26
													161 768,74
													26 668,74

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA
Ing. Jakub Zeman
66651

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpčet DPH Nemá KRÁTIT 9204

Související doklady
uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

Odpovídá: E. Buzková

zázpis
proveden 15-12-2021Ověření přípustnosti dle
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

Odpovídá: Roman Schwarz

17-12-2021

Alena Štýbnarová
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
vedoucí oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Roman Hájek, Ph.D.

ředitel

Fakultní nemocnice Olomouc

x Fed. FmL

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

I.P. Pavlova 185/6
779 00 OlomoucBTA: 10002
INV.C: 00302K7LC: 135.100, - DAA FmL
26.669, - V3

1/2022

POKRAČOVÁNÍ ROZÚČTOVÁNÍ DOKLADU - str. č.

[illegible]

Faktura - daňový doklad
Číslo: 2152102349
Prodávající (dodavatel):

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
sp. zn. B 318.

Adresa pro zaslání faktur

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice

Kupující (odběratel):

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice

IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892

Vystaveno-odesláno dne: 26.11.2021

Datum UZP: 26.11.2021

Datum splatnosti: 25.01.2022

Číslo účtu: 6606791 / 0100

Způsob platby: Platební příkaz

IBAN: CZ35 0100 0000 0000 0660 6791

Číslo objednávky: SoD ze dne 20.8.2021

SWIFT: KOMBCZPP

Fakturuje Vám dle SoD "Rekonstrukce a restaurování kamenné architektury studánky ve FN Olomouc" demontáže, přepravu, zednické práce apod.

Fakturovaná měna: CZK

Č.ř. Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1 zednické práce		1,0000	443 900,00	21 %	443 900,00	0,00	443 900,00

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
- 8 - 12 - 2021 Odbor investic (3)

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
0 %	443 900,00	0,00	443 900,00
	443 900,00	0,00	443 900,00

Zaokrouhlení:
0,00
K ÚHRADĚ CZK:
443 900,00
DPH ODVOD v CZK:

Součet DPH za 2152102349:

0,00

Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:

0,00

Celkem odvod DPH:

0,00
Souhrn plnění v režimu přenesené daňové povinnosti

Sazba	Plnění
21 %	443 900,00 CZK
	443 900,00 CZK

Dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH vám dodáváme v režimu přenesení daňové povinnosti.
Daň odvede zákazník.

Souhlas s poskytnutím částky: 135.000,-
7 brzd. daní VS: 9001, Fab. 135.000,-
Fakultní nemocnice Olomouc

Variabilní symbol: 2152102349

Zákaznická linka: 800 800 860

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava

List: 1/1

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

La rozčleňena na LFP: FP-2021-24-000086 135.000,-
FP-2021-15-001115 308.800,-



(Příprava smlouvy - Fáze 1.2. před vznikem nároku nebo závazku)

NÁZEV SMLOUVY (dodatku ke smlouvě)

Týká se akce

Smlouva o dílo - REKONSTRUKCE A RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ
ARCHITEKTURY STUDÁNKY VE FN OLOMOUC

SMLUVNÍ PROTISTRANA (Jméno/název organizace)

Veolia Energie ČR, a.s.

Předkladatel (zaměstnanec FNOL) - jméno, klinika (odbor, oddělení)

Ing. Olejníček Vladimír,

Vyjádření předkladatele smlouvy

Stručný popis toho o co se jedná, důvody a účel pořízení, výhody pro FNOL, náklady provozní (i na zaměstnance), kde bude
nastaveno/odebíráno, u přístrojů náklady na instalaci, na spotřební materiál, způsob úhrady apod.

je o realizaci rekonstrukce Společenského pramene ve FNOL na základě VZMR.

Ing. Olejníček

Datum: 24.08.2021 09:22:49

Podpis a razítko: Procházková Radomíra

Datum předání na právní útvar:

Převzal:

Způsob úhrady Provozní prostředky - z vlastních prostředků

Vyjádření právního odboru:

Datum: 24.08.2021 14:30:53

Podpis a razítko: Procházková Sabina

Vyjádření a potvrzení odborných útvarů - Název/jméno, datum

(Příprava smlouvy - Fáze 1.2. před vznikem nároku nebo závazku)

VYJÁDRĚNÍ PŘÍKAZCE OPERACE V RÁMCI PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY

Souhlasím.

Nejedná se o vzorovou smlouvu FNOL.

Včl. 3.2. opravit namísto vystavení má být doručení.

I. Schvalovací postup byl zaměřen v souladu s paragrafem 11 a 13 vyhl. č. 416/2004 Sb., na prověření

- | | |
|---|-----|
| 1. pro plnění stanovených úkolů je tato operace nezbytná | ANO |
| 2. podklady k připravované operaci jsou úplné a věcně správné | ANO |
| 3. byla dodržena kritéria hospodárnosti | ANO |
| 3. byla dodržena kritéria efektivnosti | ANO |
| 3. byla dodržena kritéria účelnosti | ANO |
| 4. je soulad mezi připravovanou operací a právními předpisy | ANO |
| 5. jsou nebo mohou se vyskytnout nějaká rizika | NE |
| v případě, že ANO - jaká: | |
| - opatření: | |
| 6. určení závazku - na individuální příslib ano ne ve výši: | |
| - na limitovaný příslib ano ne ve výši: | |

Potvrzení, že připravovaná operace je oprávněná, nezbytná a správná.
Potvrzení, že připravovaná operace je oprávněná, nezbytná a správná.
Příkazce operace: Olejníček Vladimír

Datum: 25.08.2021 11:52:33

Podpis a razítko:

VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE ROZPOČTU V RÁMCI PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY

I. Schvalovací postup byl ve smyslu paragrafu 11 a 13 vyhl. č. 416/2004 Sb., zaměřen na dodržení:

- | | |
|---|-----|
| 1. pravidel stanovených zvláštními právními předpisy | NE |
| 2. rozsahu oprávnění příkazce operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem | ANO |
| 3. rozpočtové skladby | ANO |
| 4. schváleného, případně upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové skladby | ANO |
| 5. souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s finančními prostředky | ANO |
| 6. a posouzení finančního dopadu operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém roce, případně zda budou zajištěny zdroje pro navazující rozpočtové období | ANO |
| 7. zajištění finančního krytí závazku | |
| a) individuální příslib: - název věřitele: | |
| - výše závazku: | |
| - termín plnění závazku: | |
| b) limitovaný příslib: - období limitu příslibu: | |
| - výše limitu celkem: | |
| - nevyčerpaná část limitu: | |

Bude hrazeno z finančního daru ve výši 443.900,-Kč od nadačního fondu Veolia Energie pro životní prostředí.
Darovací smlouva ve WF.
souhlasím

I. Schvalovací postup byl ve smyslu paragrafu 11 a 13 vyhl. č. 416/2004 Sb., zaměřen na dodržení:

- | | |
|---|-----|
| 1. pravidel stanovených zvláštními právními předpisy | NE |
| 2. rozsahu oprávnění příkazce operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem | ANO |
| 3. rozpočtové skladby | ANO |
| 4. schváleného, případně upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové skladby | ANO |
| 5. souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s finančními prostředky | ANO |
| 6. a posouzení finančního dopadu operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém roce, případně zda budou zajištěny zdroje pro navazující rozpočtové období | ANO |
| 7. zajištění finančního krytí závazku | |
| a) individuální příslib: - název věřitele: | |
| - výše závazku: | |
| - termín plnění závazku: | |
| b) limitovaný příslib: - období limitu příslibu: 2021 | |

(Příprava smlouvy - Fáze 1.2. před vznikem nároku nebo závazku)

- výše limitu celkem: položka INVPL 1.2.74 ve výši 12 000 000,-Kč
- nevyčerpaná část limitu: zůstatek na položce 2 159 400,6 Kč

Jedná se částečně o opravu a částečně o technické zhodnocení.

Technické zhodnocení:

Celkem:	Kč 135 100,-- bez DPH
Z toho:	
Stavební a ostatní práce:	Kč 105 100,-- bez DPH
Projektová dokumentace:	Kč 30 000,-- bez DPH

Provozní výdaj – oprava:

Celkem:	Kč 308 800,-- bez DPH
Ošetření původních prvků:	Kč 165 000,-- bez DPH
Nové pískovcové prvky:	Kč 79 000,-- bez DPH
Čistování kamene:	Kč 46 800,-- bez DPH
Oprava:	Kč 18 000,-- bez DPH

Schválení, že připravovaná operace je prověřena.**Schválení, že připravovaná operace je prověřena.****Správce rozpočtu (jméno):** Schwarz Roman

Datum: 25.08.2021 12:10:50

Podpis a razítko:

Vyjádření Odboru ekonomiky a financí (posouzení z ekonomického hlediska)

1. Prosím opravit v čl.3 odst. 3.4. **Adresa Objednatel na elektronické doručení faktury:** fin@fnol.cz /ne info@fnol.cz/
2. Upozorňuji na nestandardní ujednání v čl. 5 odst 5.2.2 a 5.2.3 bezplatný vjezd a výjezd do areálu FNOL a vydání 4 ks karet bez poplatku, bez kauce?
Prosím o opravu vyjádření správce rozpočtu uvedená cena je bez DPH, jedná se o přenesenou daňovou povinnost, tj. cena + 21% DPH
4. Dle mého názoru se jedná o investici, nutno zajistit prokolování správce rozpočtu je OPP.

PK

Datum: 30.08.2021 15:17:16

Podpis a razítko: Křivková Pavlína

Vyjádření o zapracování připomínek

Reakce na připomínky :

Dle vyjádření ing. Olejníčka jde o restaurování, a to investice není. Totéž bylo řešeno i u pevnůstky, s tím, že to není investice.

Přesto bylo vyžádáno vyjádření ing. Neudörflerové.

Dle vyjádření ing. Olejníčka nebude měněno cenové ujednání ve smlouvě.

Mgr. Sabina Procházková

Vedoucí právního odboru

Smlouva o Dílo č.
na zhotovení Díla pod názvem

**„REKONSTRUKCE A RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ ARCHITEKTURY
STUDÁNKY VE FN OLOMOUC“**

Název: **Veolia Energie ČR, a.s.**
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupená: Ing. Pavlem Míčkou, technickým ředitelem a ředitelem pro výkonnost, na základě pověření
Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 318
IČO: 451 93 410
DIČ: CZ45193410
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07
účet č.: 6606791 / 0100
IBAN: CZ35 0100 0000 0000 0660 6791
SWIFT: KOMBCZPPXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně jedné

a

Název: **Fakultní nemocnice Olomouc**
Sídlo: I.P. Pavlova 185/6, Olomouc, 779 00
Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. - ředitelem
Forma: příspěvková organizace
IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892
Bankovní spojení: Česká národní banka
účet č.: 36334811/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále také jen společně jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich jako „Smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tuto Smlouvu o Dílo (dále jen Smlouvu), již se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla na svůj náklad a nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy a Objednatel k převzetí Díla a k zaplacení Ceny za jeho provedení dle čl. 3 Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

1.1. Kontaktní osoby

- 1.1.1. Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou za Objednatele oprávněny jednat tyto osoby:**
Ve věci smluvní: Ing. Vladimír Olejníček, email: vladimir.olejnicek@fnol.cz, tel. 602 188 663
Ve věci zhotovení Díla: Ing. Vladimír Olejníček, email: vladimir.olejnicek@fnol.cz, tel. 602 188 663
- 1.1.2. Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou za Zhotovitele oprávněny jednat tyto osoby:**
Ve věci smluvní: Bc. Martina Řeháková
Ve věci zhotovení Díla: Ing. Radek Dubravský

Kontaktní osoby, uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2. této Smlouvy, nejsou oprávněny měnit její obsah, pokud toto jejich oprávnění neplyne z obchodního / živnostenského rejstříku, plné moci, pověření apod.

- 1.1.3. Kterákoliv ze Smluvních stran může v průběhu realizace Smlouvy změnit výše uvedené pověřené osoby a spojení na**

ně. Tato změna musí být bezodkladně oznámena druhé Smluvní straně formou dopisu, podepsaného oprávněným/oprávněnými zástupcem/zástupci, zaslaného druhé Smluvní straně doporučenou poštou s potvrzeným doručením nebo kurýrem. Taková změna je účinná vůči druhé Smluvní straně dnem doručení dopisu o změně osob a spojení.

- 1.1.4. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí formou dodávky „na klíč“ kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční Dílo " **REKONSTRUKCE A RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ ARCHITEKTURY STUDÁNKY VE FN OLOMOUČ** " v souladu s podmínkami a termíny ve Smlouvě uvedenými, v souladu s příslušnou dokumentací Díla a v souladu s platnými právními předpisy a zákony České republiky. Předmět Díla je popsán v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace předmětu Díla.
- 1.2. Dílo zahrnuje zejména tyto činnosti a dodávky:
- 1.2.1. Vyhotovení veškeré potřebné projektové dokumentace pro vybudování Díla.
- 1.2.2. Vybudování Díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy
- 1.2.3. Likvidace veškerého odpadu prokazatelně v souladu s platnými právními předpisy až na místo jeho trvalého uložení
- 1.3. Místo plnění: Areál Fakultní nemocnice Olomouc, v blízkosti bývalého zrušeného suchého jezírka, umístěného na pozemku par. č. 702/I, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, LV č. 6930, viz zakres jako příloha smlouvy č. 2

2. CENA ZA DÍLO

- 2.1. Celková smluvní Cena (bez DPH) v rámci Smlouvy činí:
443 900,- Kč
slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc devět set korun českých bez DPH

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 3.1. Úhrada ceny za Dílo dle čl. 2. Smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury - vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla. Právo na zaplacení smluvní ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.
- 3.2. Faktura je splatná šedesát (60) kalendářních dnů od data jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději do 5-ti (5) kalendářních dnů od data vystavení.
- 3.3. Daňový doklad - faktura musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- označení faktury a její číslo
 - Název, sídlo, DIČ, IČO Objednatele
 - Obchodní firma, sídlo, DIČ, IČO Zhotovitele a jeho bankovní spojení
 - název Díla, číslo Smlouvy Objednatele
 - rozsah a předmět plnění
 - fakturovanou částku vč. DPH
 - další náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH platného v době uskutečnění zdanitelného plnění
 - v případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být na faktuře uvedeno toto sdělení:
„Dle § 92 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. Vám dodáváme plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno
 - datum vystavení a odeslání faktury
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - splatnost
- 3.4. Faktura bude doručena v jednom (1) vyhotovení poštou nebo elektronickou cestou. Místem doručení jsou adresy Objednatele uvedeny níže. Za rozhodný den doručení faktury se považuje datum doručení do poštovní nebo e-mailové schránky Objednatele.

Adresa Objednatele na písemné doručení faktury:

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc, 779 00
Adresa Objednatel na elektronické doručení faktury: info@fnol.cz

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede Dílo, které je předmětem Smlouvy řádně a včas, a předá jej Objednateli za podmínek a způsobem dohodnutým Smlouvou nejpozději do:

30. listopadu 2021.

5. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

5.1. Závazky Zhotovitele

- 5.1.1. Předmět Smlouvy provede Zhotovitel dle norem a právních předpisů ČR, které se na předmět Smlouvy vztahují a které platí k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v souladu s ČSN (ČSN/ČSN EN, ČSN/ISO), které mohou být použity při výrobě částí stavby a technologických zařízení, realizací a provozu Díla.

5.2. Závazky Objednatel

- 5.2.1. Objednatel se zavazuje předat nejpozději ke dni podpisu této smlouvy Staveniště pro provedení Díla., tj. plochu staveniště a přípojku elektřiny v odpovídající dimenzi a kapacitě.
- 5.2.2. Objednatel zajistí bezplatný vjezd a výjezd pro:
- 3x jízda nákl. auto s hydraulickou rukou
 - 2x jízda Avie kontejner (odvoz bouraných cihel, odvoz zeminy po výkopu nového základu)
 - 2x jízda doprava betonu
- 5.2.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 4 ks karet pro vstup a vjezd vozidel Zhotovitele a jeho poddodavatelů (stavební a restaurátorské práce).

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má Dílo při podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním Objednatel nebo okolnostmi „vyšší moci“.
- 6.2. Zhotovitel neodpovídá za vady:
- vzniklé v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů, nebo vadné údržby Díla ze strany Objednatel
 - jestliže Objednatel bez předchozí písemné dohody se Zhotovitelem dá provést opravu na předaném Díle (s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast Zhotovitele nutná), a takováto oprava prokazatelně způsobí vznik konkrétní vady,
 - jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provede na předaném Díle jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní vady
- 6.3. Oznámení vad Díla (reklamace)
- Vady zjištěné v záruční době je Objednatel povinen reklamovat bezodkladně písemně nebo e-mailem popř. faxem, u kontaktních osob Zhotovitele. V reklamaci musí Objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné důkazní prostředky. Kontaktní osoby za Zhotovitele i Objednatel budou stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla.
- 6.4. V případě vady Díla se Zhotovitel dostaví nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po obdržení reklamace na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě, dohodne s Objednatel technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění reklamované vady a zahájí odstraňování vady. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá. Náklady spojené s odstraněním těchto vad, nese až do vyřešení odpovědnosti Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti Objednatel za vzniklé vady Díla budou náklady přefakturovány Objednateli.
- 6.5. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán Protokol o odstranění reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním Protokolu o odstranění reklamované vady oběma Smluvními stranami.

- 6.6. Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané Dílo splňuje záruční požadavky, uvedené v této Smlouvě. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu Díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci Díla, za správné a úplné vypracování projektu. Záruční doba Díla začíná běžet dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a trvá (60) měsíců.
- 6.7. Jestliže vinou vady z důvodů na straně Zhotovitele dojde k zastavení provozu Díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být Dílo provozováno.
- 6.8. Jestliže Zhotovitel poté, co byl vyrozuměn, neodstraní vadu během přiměřené doby dohodnuté s Objednatelém v průběhu reklamačního řízení, má Objednatel právo zahájit takové postupy k jejímu odstranění, které budou nezbytné (včetně odstranění vady třetí osobou), a to na riziko a náklady Zhotovitele a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu Smlouvy. Tytéž postupy může Objednatel použít v případě, že Zhotovitel si nedohodne na výzvu Objednatele technicky reálný termín pro odstranění vad.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 7.1. Předmět plnění podle Smlouvy je splněn řádným a včasným předáním předmětu Díla Objednateli.
- 7.2. Dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelém převzato neprodleně po předání Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

8. NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. V případě porušení povinnosti dle Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran mající za následek vznik škody, zavazuje se povinná strana škodu nahradit v plné výši.
- 8.2. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám.

9. PODDODAVATELÉ

- 9.1. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel bude zajišťovat vybudování předmětu díla s pomocí (pod)dodavatelů a zavazuje se plnit své závazky uvedené v této smlouvě také vůči těmto poddodavatelům.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že celá dodávka Díla podle této Smlouvy neporušuje patentová nebo jiná chráněná práva třetích osob a že nevykazuje jiné právní vady.
- 10.2. Pokud dojde k ukončení Smlouvy nebo nedokončení Díla z příčin na straně Objednatele, má Zhotovitel právo konečnou fakturou vyúčtovat prokazatelnou poměrnou část provedených prací.
- 10.3. Zhotovitel povede od předání a převzetí staveniště stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě, vedený dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, kde bude zapisovat přehled skutečností důležitých pro plnění Smlouvy, zejména údaje o postupu prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací ve srovnání s projektovou dokumentací apod. Stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě, musí být neustále na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě bude Zhotovitelem veden až do dokončení stavby popř. do odstranění vad a nedodělků z Protokolu o předání a převzetí Díla. Tento stavební deník lze použít za podmínek této Smlouvy i v případech, kdy jsou odstraňovány vady zjištěné v záruční době. Po dokončení stavby předá Zhotovitel dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, originál stavebního deníku Objednateli. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 10.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle vzájemně odsouhlasené dokumentace pro provádění stavby, podle smluvních podmínek, technických norem, při splnění podmínek stavebního povolení popř. podle dokumentace přikládané k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení nebo ohlášení stavby a v souladu s právními předpisy.
- 10.5. Zhotovitel odpovídá za řádné zajištění opatření z hlediska životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění protipožárních opatření vyplývajících z povahy jeho prací.
- 10.6. Pokud dojde ze strany Zhotovitele k poškození majetku nebo zdraví třetích osob při zhotovení Díla, provede Zhotovitel neprodleně nápravu na vlastní náklady.

REKONSTRUKCE A RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ ARCHITEKTURY STUDÁNKY VE FN OLOMOUC

Technologický postup:

1. STAVEBNÍ PRÁCE

Demontáže:

Zaměření, demontáž kamenných částí, transfer do dílny, demontáž cihelné vyzdívky, odvoz na skládku, mechanizace/auto s rukou, valník

Celkem 29 500,00

Nový základ:

Výkop základu pod architekturu včetně výkopu šachty v zadní části základu pro možnost údržby vodovodního potrubí, odvoz zeminy, zhotovení bednění, osazení vodovodních trubek přítoku a odtoku, vylití betonu, mechanizace

Celkem 32 600,00

Zednické práce:

Vyzdění cihlového nosného bloku (cca 4m3), povrchové omítky, přeprava materiálu

Celkem 43 000,00

2. RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH ČÁSTÍ

Původní pískovcové prvky:

Čištění mechanické, chemické, biosanace, zpevnění korodovaných partií organokřemičitým roztokem, nezbytné doplnění novodobě poškozených partií (nerezové armování, minerální tmel v nezátěžových partiích), lepení a fixace degradovaných částí nerez čepy, popř. výměna degradovaných nosných částí, lokální lazurní barevné retuše

Celkem 165 000,00

- 10.7. Vlastnická práva k Dílu přecházejí na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Tímto okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na Díle.
- 10.8. Strany se dohodly, že pokud nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci věcně a místě příslušný soud ..
- 10.9. Tato Smlouva je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení Smlouvy má v případě rozporné interpretace přednost před Přílohou tvořící nedílnou součást Smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly nepřihlížet k žádným obchodním zvyklostem, které tedy dle této dohody Smluvních stran nemají přednost ani před touto Smlouvou ani před ustanoveními zákona (OZ) , která nemají donucující účinky.
- 10.10. Podmínky Smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného Dodatku ke Smlouvě, vlastnoručně podepsaným oběma Smluvními stranami s uvedením data, kdy Dodatek nabude účinnosti.
- 10.11. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.
- 10.12. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.
- 10.13. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha dle níže uvedeného seznamu.
- 10.14. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) exemplářích, všechny s platností originálu, ve dvou (2) pro Objednatele a ve dvou (2) pro Zhotovitele.
- 10.15. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZRS“) a zavazuje se na vlastní náklady zajistit zveřejnění této smlouvy v souladu se ZRS.
- 10.16. Zhotovitel pro účely efektivní komunikace s Objednatelem, a případně pro účely plnění Smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje kontaktních osob a/nebo jiných subjektů údajů uvedených ve Smlouvě či se jinak podílejících na plnění Smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související se Smlouvou, a to v průběhu účinnosti této Smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze Smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednatel se zavazuje všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje předává na základě této smlouvy Zhotoviteli, informovat o zpracování Zhotovitelem a předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro dodavatele a další osoby dostupných na internetové adrese Zhotovitele <https://www.vecr.cz>.
- 10.17. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS.

V Olomouci dne 20.8.2021

V Olomouci dne 20.8.2021

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Pavel Míčka,
technický ředitel a ředitel pro výkonnost,
na základě pověření

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Region Střední Morava
Tovární 839/46
779 00 Olomouc



6

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Ředitel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Právní 185/6
779 00 Olomouc

Přílohy:

1. Specifikace předmětu Díla
2. Nové umístění studánky

Nové pískovcové prvky:

2 ks kopií obratových říms, doplnění podélných pískovcových kvádrů v líci zdiva, doplnění části tympanonu, zhotovení spodní vany (umývadla) pod kohoutkem (nový prvek dle návrhu architekta)

Celkem 79 000,00

Osazování:

Postupné osazování všech kamenných částí na zděné jádro v návaznosti na osazení/umístění potrubí přítoku a odtoku vody, osazení spodní nové pískovcové vany, mechanizace, spárování kamenných částí, barevné retuše spár.

Celkem 46 800,00

Doprava (osobní, nákladní/provozovna Božanov-lom pískovec):

Celkem 18 000,00

3. PROJEKT



zahrnuje:

- umístění objektu, přesné místo, grafický poklad
- drobné úpravy stávajícího objektu - výtok vody, mísa pod výtokem
návrh originálního řešení
- technická spolupráce se zpracovatelem dokumentace pro profese, resp. pro specifikaci realizace
- účast na výrobních výběrech a kontrolních dnech

• Celkem - 60 hodin..... 30 000,00

Cena za dílo celkem

443 900,00 Kč bez DPH

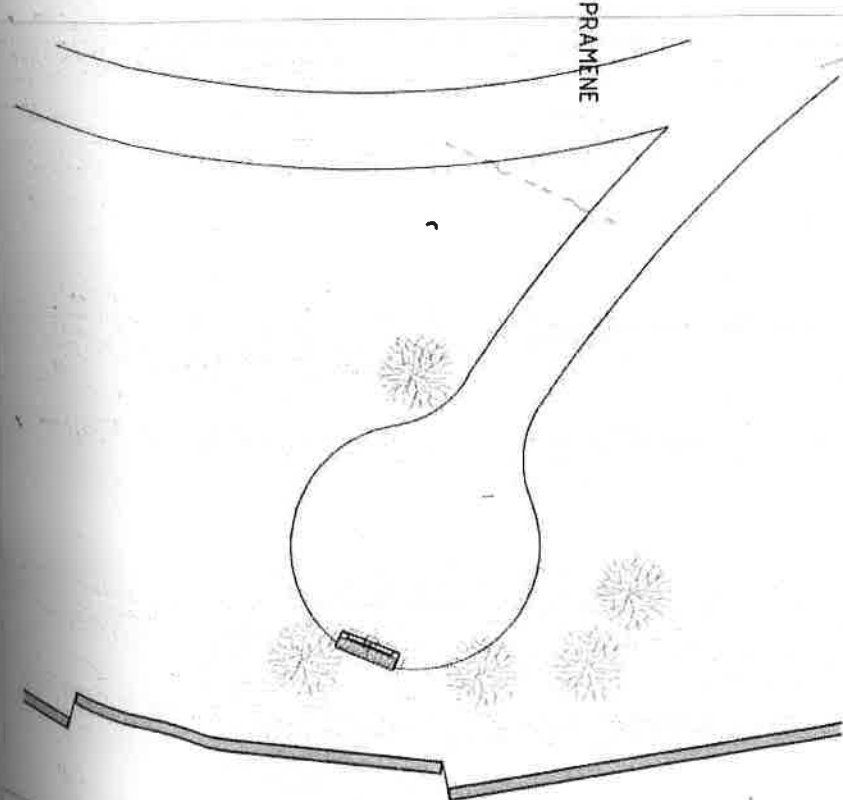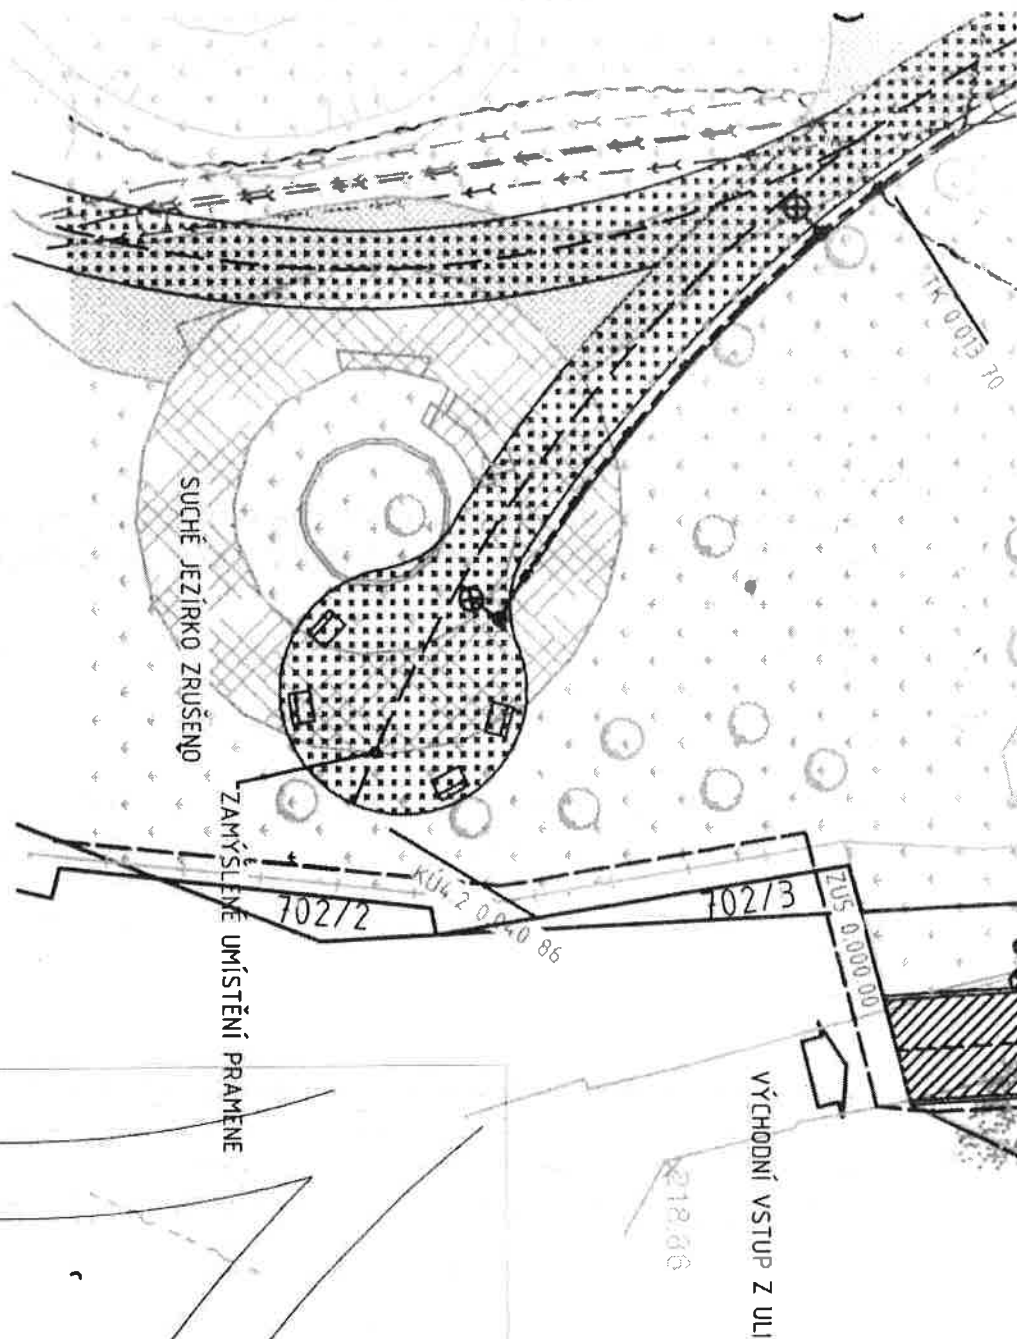

ATELIÉR LUBIČ
 STARÁ VÍŠŇA 196/6, 779 00 OLOMOUČ
 TEL: 608 600 643
 E-MAIL: lubic@atelierlubic.cz

KLIENT
 VEOLIA

Projekt na přemístění a obnovení "Společenského pramene" ve FN Olomouc
 Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
 Situace

PROJEKTANT
 atelierlubic.cz

DATUM
 12.05.2021
 1:200

PRACOVNÍ VERZE

01

Výpis z účtu

K účtu: 174-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.09.2021

Poř.č. : 65

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Fond reprodukce majetku
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ23 0710 0001 7400 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 27.09.2021 1 106 785 298,67

Debetní obrát (0) 0,00

Kreditní obrát (3) 223 831 856,78

Konečný zůstatek

ze dne 29.09.2021 1 330 617 155,45

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
29.09.2021	Příchozí úhrada	21929D0009914	92021	200 000 000,00
	123-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8		
29.09.2021	S803/2909/62/00001			
29.09.2021	Příchozí úhrada	21929D0009938	9001	135 100,00
	10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8		
29.09.2021	S803/2909/63/00002			
29.09.2021	Příchozí úhrada	21929D0010005	821	23 696 756,78
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8		
29.09.2021	S803/2909/64/00001			
Konečný zůstatek				1 330 617 155,45

FNOL: Bankovní výpis

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
www.fnol.cz

Vybrané záznamy (3/3) 30.09.2021 8:18:27

Evidenční číslo položky	Variabilní symbol	Datum platby	Kredit v	Debet v UM	Předmět	Protiúčet
BV-2021-01CI-0065(190)	92021	29.09.2021	200 000 000,00	0,00	Převod z rezervního fondu - přerozdělení HV 2020	123-36334811 / 0710
BV-2021-01CI-0065(191)	9001	29.09.2021	135 100,00	0,00	UH Fakult.nemoc.Olomouc	10006-36334811 / 0710
BV-2021-01CI-0065(192)	821	29.09.2021	23 696 756,78	0,00	UH Fakult.nemoc.Olomouc	36334811 / 0710
Celkem			223 831 856,78	0,00		

Počáteční stav 1 106 785 298,67
Kredit (+) celkem 223 831 856,78
Debet (-) celkem 0,00
Zůstatek 1 330 617 155,45



Fakultní nemocnice Olomouc

nadační fond Veolia

obd.

09/2021

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

kopie - originál u ŽV

Evidenční číslo dokladu

FP-2021-45-000273

Firma - věřitel, dlužník Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět převod - z Darů na FRM

NADAČNÍ FOND

výše závazku, nároku

135 100,00 ✓

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ Odpovídá: A. Štyanarová
Individuální příslib ve výši:		2 9 -09- 2021
Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období:		
Výše limitu:		
Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
000	395	99	000				395	99	000				135 100,00
	241	54				9001	416	18	400				135.100 ✓
	30.09.2021/010/0065(191)												
Zboží řádně dodáno dle DL, FA							Práce provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE) Odpočet DPH Nemá							FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Odpovědní účetnictví Odpovídá: M. Dandová 2 9 -09- 2021 Účetní předpis a zaúčtování: Podpis:						
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.							FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Odpovědní účetnictví Odpovídá: Bc. Jana Jakšová zápis proveden 30 -09- 2021						

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ - INKASU

ČNB Praha

splatný dne

29.09.2021

název peněžního ústavu

zúčtujte


na vrub účtu číslo

10006-36334811/0710

		symboly platby			
ve prospěch účtu číslo	částku	variabilní	zvl.dis.	konst.	specifický
174-36334811/0710	135 100,00	9001		0308	2

doplňující údaj banky	údaje pro vnitřní potřebu příkazce
	Nadační fond Veolia-převod na FRM

V Olomouci 27.9.21



razítko a podpis příkazce

Jakšová Jana, Bc.

Od: Jakšová Jana, Bc.
Odesláno: čtvrtek 9. září 2021 9:19
Komu: Knápek Martin, Ing.; Olejníček Vladimír, Ing.
Kopie: Křivková Pavlína, Ing.; Buzková Eva
Předmět: Rekonstrukce kamenné studánky FNOL

Sledování:	Příjemce	Přečteno
	Knápek Martin, Ing.	
	Olejníček Vladimír, Ing.	Přečteno: 09.09.2021 10:20
	Křivková Pavlína, Ing.	
	Buzková Eva	Přečteno: 09.09.2021 9:28

Dobrý den,
na základě telefonického rozhovoru Vám posílám rozdělení výdajů na rekonstrukci kamenné studánky FNOL.
Technické zhodnocení bude navázáno na nově zaevidovanou (aktivovanou) pískovcovou studánku.

Technické zhodnocení:

Celkem:

Kč 135 100,-- bez DPH

Z toho:

Stavební a ostatní práce:

Kč 105 100,-- bez DPH

Projektová dokumentace:

Kč 30 000,-- bez DPH

Provozní výdaj – oprava:

Celkem:

Kč 308 800,-- bez DPH

Ošetření původních prvků:

Kč 165 000,-- bez DPH

Nové pískovcové prvky:

Kč 79 000,-- bez DPH

Osazování kamene:

Kč 46 800,-- bez DPH

Doprava:

Kč 18 000,-- bez DPH

Pěkný den.

Bc. Jana Jakšová

účetní

Oddělení účetnictví

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

Tel.: +420 585 853 114

E-mail: jana.jaksova@fnol.cz

web: www.fnol.cz
